

## Звіт про підсумки роботи відділу капітального будівництва міської ради за 9 місяців 2019 року

### ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Одним з пріоритетних напрямів діяльності відділу є ремонт та будівництво об'єктів дорожньо-мостового господарства. Значна робота в місті в 2019 році була проведена по даних об'єктах. Це капітальні та поточні ремонти доріг, тротуарів, внутрішньо будинкових проїздів, тротуарів та доріжок. Також виконувалися роботи з реконструкції тротуарів в місті, на що виділено кошти в сумі **2947,0** тис. грн. В основному виконувалися роботи в центральній частині міста на тротуарах по вул. Гоголя, Старосвітській та розпочалися роботи по вул. Сорочинській.




Станом на 01 жовтня оплачено коштів на реконструкцію тротуарів в сумі **965,305** тис. грн. Виконання даних робіт надасть більш естетичного та привабливого вигляду нашому місту-курорту.

В 2019 році на капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті виділені кошти в сумі **18 005,7** тис. грн., з яких **16 343,8** тис. грн. виділено на ремонт доріг. На поточний ремонт

доріг та тротуарів в місті виділені кошти в сумі **4118,2** тис. грн., які практично освоєні в повному обсязі.

Роботи виконувалися по всіх мікрорайонах.

В **Центральному** мікрорайоні продовжувалися роботи по капітальному ремонту дороги з тротуаром по вул. Я.Усика. Роботи проводилися на основі проведеної відділом в 2018 році процедури закупівлі робіт, де переможцем було визначено місцевого підрядника - ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» (директор Широкий О.Г.) В 2019 році всі роботи були завершені та виконані в повному обсязі та якісно. По даному об'єкту навіть були зекономлені бюджетні кошти в межах оголошеної процедури закупівель, які дали змогу виконати додаткові види робіт в рахунок укладеного між ВКБ та Підрядником договору підряду. Всі додаткові роботи були погоджені з проєктантами, була відкоригована проєктно-кошторисна документація та пройдена експертиза відкоригованого проєкту. На даний об'єкт було виділено **3573,0** тис. грн. , які освоєні в повному обсязі. Дані роботи привели в належний технічний стан дорожнє покриття після виконання в 2018 році робіт по капітальному ремонту мереж дощової каналізації та дали змогу привести покриття тротуарів в центрі міста в привабливий вигляд та до належного стану.

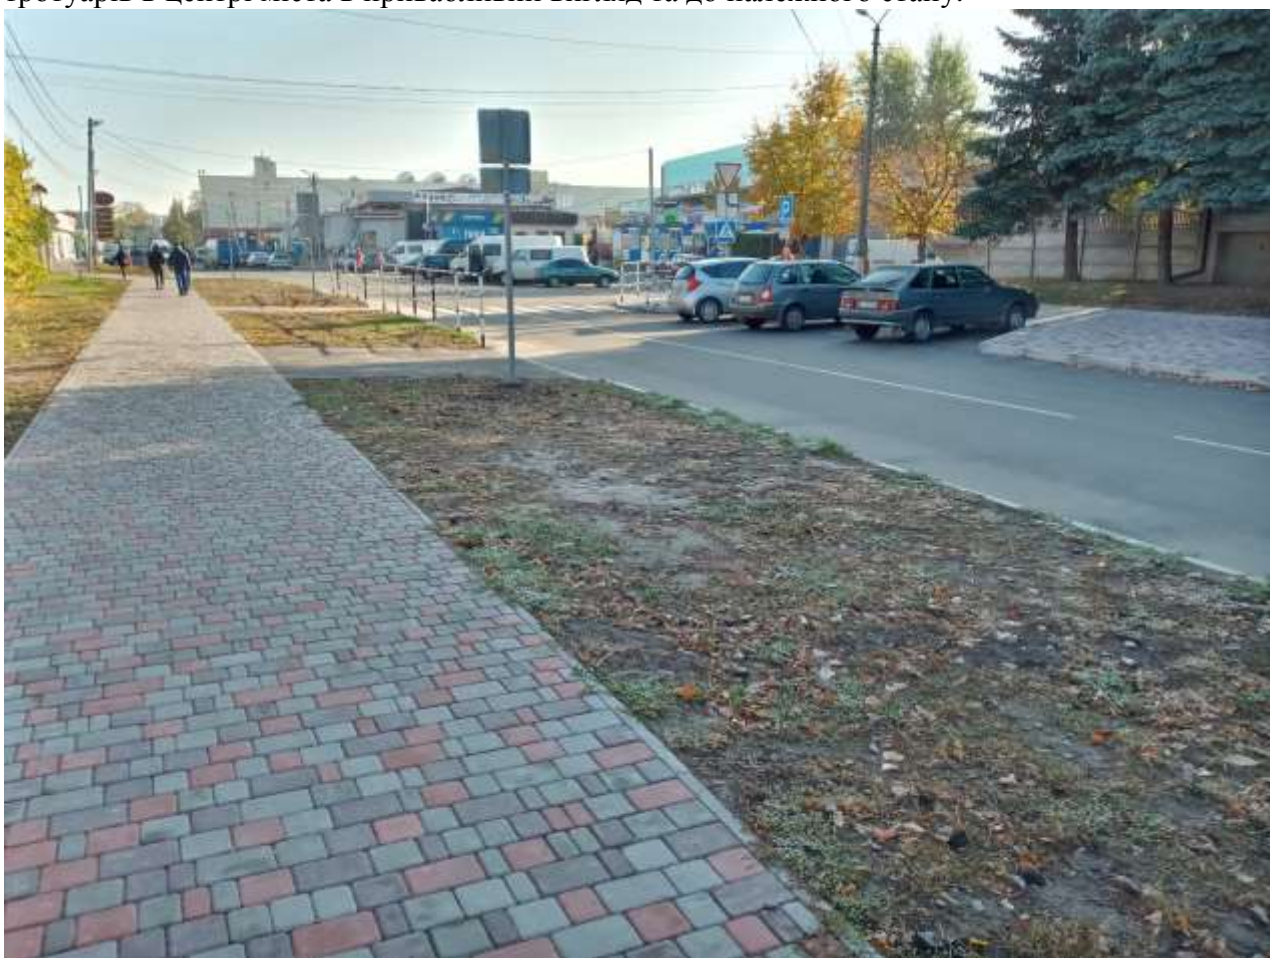

Також в даному мікрорайоні виконувалися роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Гоголя в районах військкомату та від перехрестя дороги по вул. Котляревського в сторону автошляхопроводу. По обох об'єктах було виконано робіт майже на 3000,0 тис. грн. За кошти міського бюджету та дольової участі мешканців були проведені роботи з капітального ремонту дороги по вул. Ігнатенка від №49 до №55. Дані роботи проводилися у відповідності з Положенням про розмір дольової участі населення у спів фінансуванні поточного та капітального ремонтів об'єктів дорожнього господарства міста, затвердженим сесією міської ради у 2017 році. Кошти міського бюджету становили 229,6 тис. грн., кошти мешканців - 15,0 тис. грн. Були завершені роботи з капітального ремонту тротуару по вул. Андрєєва. Також в даному мікрорайоні були проведені роботи з поточного ремонту доріг та тротуарів, куди витрачено 1253,3 тис. грн. Були проведені

ремонти тротуарів по вул. Харківка від №86 до магазину «Слава», тротуар по вул. Гурамішвілі, тротуар біля міського пляжу та тротуар по вул. Гоголя біля будинку №72/1.



Значна робота в мікрорайоні проведена з поточного ремонту внутрішньо будинкових, внутрішньо квартальних проїздів та доріжок – виконані роботи у 11 дворах на суму **281,5** тис. грн.

В мікрорайоні *Мінзаводський* також проведені значні роботи з капітальних ремонтів – виконані роботи по дорогах вул. Висоцького від №43 до №65 ( при дольовій участі мешканців в сумі 30,0 тис. грн.) , Шишацькій в двох районах - в районі КП «Спецкомунтранс» та від перехрестя вул. Вокзальної до вул. Спартаківської та частково вул. Вовка. На дані дороги витрачено бюджетних коштів в сумі 2993,1 тис. грн. Також було виготовлено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту дороги по вул. Криничній та пройдено експертизу. Реалізація даного проекту планується в 2020 році. Проводилися роботи з поточного ремонту доріг з а/б покриттям на 10 дорогах, кошти міського бюджету становлять 686,6 тис. грн. Була влаштована автомобільна стоянка по вул. Свидницького біля амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги, проводилися роботи з поточного ремонту внутрішньо будинкових проїздів у 6 дворах на суму **178,3** тис. грн.

В мікрорайоні в 2019 році розпочалися роботи з капітального ремонту мереж дощової каналізації (2 черга). Роботи проводяться по результатах відкритих торгів, проведених в 2019 році відділом капітального будівництва. Переможцем визначений ФОП Заєць А.В. На даний об'єкт виділені кошти з міського бюджету в сумі **2600,00** тис. грн. Планується до кінця поточного року завершити роботи на ділянці по вул. Комарова, мешканці якої потерпають найбільше під час паводків та великих опадів.



По мікрорайону **Промисловому** виконуються роботи з капітального ремонту дороги по провулку Багачанському та тротуару по вул. Багачанській (непарна сторона). Витрачено на дані об'єкти 1440,0 тис. грн. Було капітально відремонтовано внутрішньо будинковий проїзд по вул. Багачанській,60 на загальну суму **467,7** тис. грн. З поточного ремонту доріг виконані роботи на п'ятьох вулицях на суму 589,8 тис. грн., виконувалися роботи з ремонту тротуарів по вул.Багачанській від №52 до повороту буд. №104 та тротуару по вул. Робітничій, значна робота проведена з ремонту внутрішньо будинкових проїздів та доріжок по вул. Багачанській. Також планується в поточному році виконати роботи з будівництва бар'єрного огородження на перехресті вулиць Багачанської та Робітничої, куди виділені кошти в сумі **753,0** тис. грн. Роботи по даному об'єкту вже розпочалися і плануються найближчим часом завершити.

В мікрорайоні **Почапці** завершені роботи з капітального ремонту дороги по вул. Д.Озеро (кошти державної субвенції, які залишилися з 2018 року в сумі 166,2 тис. грн.), проведені роботи з капітального ремонту дороги по вул. Зірковій від №1 до №39 за кошти міського бюджету та дольової участі мешканців в сумі 75,0 тис. грн.; дороги з влаштуванням автомобільної стоянки по вул. 9 Травня. По поточному ремонту доріг виконані роботи на 5 вулицях в сумі 26,4 тис. грн. та тротуар по вул. Д.Озеро (між вул. Визволителів та вул. Дружби) на суму 30,5 тис. грн.

По мікрорайону **Лісок** були проведені роботи з капітальних ремонтів доріг по вул. Котляревського (кошти державної субвенції з 2018 року в сумі 68,7 тис. грн.) , вул. Європейській (від вул. Хуторянської до вул. Єрківської) за рахунок коштів міського бюджету в сумі 760,0 тис. грн. Продовжувалися роботи з капітального ремонту тротуару по вул. Котляревського на суму 400,0 тис. грн. Проводилися роботи з поточного ремонту доріг на суму 244,7 тис. грн. Були проведені роботи з капітального ремонту автобусних зупинок по вул. Луговій в районі будинків №87 та №100 на загальну суму **238,3** тис. грн.



В мікрорайоні *Личанка* проведені частково роботи з капітального ремонту дороги по вул. Садовій за дольової участі мешканців в сумі 28,0 тис. грн. та коштів міського бюджету в сумі 505,4 тис. грн. Також були продовжені розпочаті в 2018 році роботи з капітального ремонту тротуару по вул. Єрківській (від церкви і до кінцевої автобусної зупинки). Було капітально відремонтовано елементи благоустрою з влаштуванням автомобільної стоянки по вул. Ламаній (в районі амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги) на суму **162,1** тис. грн.

По мікрорайону *Спортивному* за дольової участі мешканців в сумі 20,0 тис. грн. виконані роботи з капітального ремонту ділянки дороги по вул. Троїцькій від №158 до перехрестя з вул. Зоріна. Також за кошти міського бюджету виконувалися роботи з капітального ремонту дороги по вул. Комишнянській на суму 1000,0 тис. грн. За кошти міського бюджету було заасфальтовано автобусну зупинку з влаштуванням під'їзних карманів по вул. Тичини (непарна сторона), куди витрачено коштів в сумі **73,1** тис. грн.



Планується виконати капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Жоледж», куди виділені кошти в сумі **160,0** тис. грн. На даний момент укладений договір з комунальним підприємством КП «Спецкомунтранс» та отримані всі дозвільні документи на виконання робіт.

Продовжувалися роботи з будівництва велодоріжок по вул. Гоголя, по яких були проведені відкриті торги в 2017 році. Сума укладеного договору по результатах торгів становить 7 069,9 тис. грн. За 2017-2018 роки з міського бюджету було виділено лише 1138,6 тис. грн. В поточному році на виконання даних робіт виділені кошти в сумі **500,0** тис. грн., які планується освоїти в повному обсязі.

В 2019 році обстежено та виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт авто шляхопроводу. Сума зведеного кошторисного розрахунку становить **39 274,7** тис. грн. Даним проектом передбачено розбирання комплексу мостового полотна - покриття дороги, тротуарних блоків, огороження та ін.; влаштування монолітної з/б плити; заміна тротуарних блоків на монолітні тротуари; заміна деформаційних швів; влаштування нової гідроізоляції та організованого водовідведення; заміна парапетного та перильного огороження на металеве оцинковане; влаштування нового дорожнього покриття на проїзній частині та тротуарах; капітальний ремонт підходів та інші супутні роботи. Реалізація даного проекту планується в 2020 році.

### **ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО**

Відділом капітального будівництва в 2019 році були продовжені роботи спрямовані на забезпечення населення якісними послугами з водопостачання. Були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об'єкту «Будівництво водогону по вул. Микиші та прилеглих вулицях і провулках в м. Миргород Полтавської області». По результатах торгів був визначений переможець – ТОВ «Грандкорт». Сума укладеного договору по результатах торгів становить 2 095,0 тис. грн., з міського бюджету на 2019 рік виділені кошти в сумі **530,0** тис. грн., які були освоєні в повному обсязі ще в липні 2019 року. Для пришвидшення робіт проводилися збори з мешканцями, яким було запропоновано прийняти дольову участь у фінансуванні робіт. Але на жаль станом на 01 жовтня з мешканцями укладено лише 19 договорів замість 80-ти та отримано коштів лише 26,7 тис. грн. Тому подальше проведення робіт було припинено в зв'язку з відсутністю коштів в

міському бюджеті та затримкою укладання договорів з мешканцями та повільною їх оплатою.

В 2019 році виконувались роботи з реконструкції водогону по вул. М.Філянського. Роботи виконані в повному обсязі на суму 137,1 тис. грн., в тому числі значну суму коштів в реалізацію даного проекту вклали мешканці вулиці – 46,4 тис. грн.

### **ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ.**

В 2019 році відділом капітального будівництва в межах реалізації проекту Європейського Союзу «Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород» «Могедіко» виготовлена проектно-кошторисна документація та пройдена експертиза проекту по об'єкту «Реконструкція котельні по вул. Прорізній,4а та теплових мереж шляхом об'єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області». По даному проекту передбачено фінансування з двох джерел: грантові кошти та кошти міського бюджету. За проектні роботи оплата здійснювалася з двох джерел: грантові кошти в сумі **59,832** тис. грн.; кошти міського бюджету – **444, 0472** грн. В даний час підготовлена тендерна документація для проведення процедури відкритих торгів по вищезазначеному об'єкту та подана на погодження команді підтримки. Після погодження тендерної документації командою підтримки будуть оголошені відкриті торги на закупівлю робіт та визначений виконавець робіт . Кошторисна вартість об'єкту становить 14 401,412 тис. грн.

В рамках реалізації цього ж проекту виготовлена проектно-кошторисна документація по об'єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» комбінованого типу по провул. Тупий в м. Миргород Полтавської області». В даний час проект проходить експертизу, після проведення якої будуть оголошені відкриті торги на закупівлю робіт.

### **ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я.**

В 2019 році була введена в експлуатацію амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги в мікрорайоні «Мінзаводський». Роботи виконувало приватне підприємство «Метан», яке зарекомендувало себе з позитивного боку та виконало роботи вчасно та якісно. Із виділених міською радою коштів в сумі **995,0** тис. грн. було освоєно 940,0 тис. грн. (55,0 тис. грн. бюджетних коштів було зекономлено). Об'єкт був введений в експлуатацію в травні місяці поточного року.



Постільки дане підприємство показало себе з кращого боку на даному об'єкті було прийняте рішення призначити виконавцем робіт на амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги в мікрорайоні «Почапці» також ПП «Метан». На даний об'єкт виділені кошти з міського бюджету в сумі **1500,0** тис. грн. Станом на початок жовтня вже виконані роботи по влаштуванню зовнішніх мереж водопостачання, зовнішніх мереж електропостачання з установленням обліку електричної енергії, влаштування фундаментів та каркасу із дерев'яних брусів. До кінця року амбулаторію планується ввести в експлуатацію.





## **ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.**

Відділом капітального будівництва в 2019 році проводилися роботи з реконструкції стадіону «Старт»: це перехідний об'єкт з 2018 року - реконструкція частини приміщень стадіону «Старт» по вул. Гоголя,175: роботи завершені в квітні поточного року та введені в експлуатацію в травні 2019 року. Сума виконаних робіт становить **111,4** тис. грн. По іншому об'єкту : реконструкція південної трибуни стадіону виконано обстеження трибун та виготовлений звіт. В даний час йде процедура укладання договору на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту. До кінця року виготовлення ПКД завершиться та можливо розпочнуться підготовчі роботи по об'єкту.

## **СОЦІАЛЬНА СФЕРА**

В 2019 році у відділі капітального будівництва виготовлені ПКД та пройдені експертизи проектів по двох об'єктах, які плануються до реалізації за кошти Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми України (НКПУ) та міського бюджету : «Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова,5 в м. Миргород Полтавська обл.» (кошторисна вартість 27 278,769 тис. грн.) та «Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя,173/2 в м Миргород Полтавської області» (кошторисна вартість 26 283,470 тис. грн.) . По одному з них оголошені відкриті торги - по школі №1. Аукціон по розкриттю тендерних пропозицій призначений електронною системою закупівель на 23 жовтня поточного року. Після розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця відділом буде з переможцем підготовлений договір та наданий на погодження в Європейський інвестиційний банк. Після отримання резолюції від банку «без заперечень» буде остаточно укладений договір та оплачені кошти попередньої оплати на виконання робіт. Також через ВКБ буде оголошений конкурс на визначення виконавця з технічного нагляду за об'єктом. Та ж сама процедура до кінця року планується і по іншому об'єкту, який планується до реалізації через НКПУ.

В 2019 році відкоригований кошторис та пройдена експертиза проекту «Нове будівництво центральної сцени за адресою: вул. Гоголя,153-В в м. Миргород Полтавської області». Початок реалізації проекту планується в 2020 році. Кошторисна вартість проекту становить 7 438,907 тис. грн.

Також через відділ капітального будівництва планується реалізація проекту по об'єкту «Реконструкція нежитлового приміщення з встановленням газового котла по вул. Гоголя,92 в м. Миргород Полтавської області», куди виділені кошти з міського бюджету в сумі **50,0** тис. грн. За виділені кошти планується виготовити проектно-кошторисну документацію та пройти відповідні експертизи. Після погодження ПКД буде оголошений конкурс на визначення виконавця робіт і за умови виділення додаткових коштів на реалізацію даного проекту роботи розпочнуться та будуть виконані в поточному році.

Працівниками відділу в 2019 році укладено станом на 01 жовтня 2019 року 334 договора та додаткових угод щодо виконання будівельних робіт, робіт з технічного та авторського нагляду, на виготовлення проектно-кошторисних документацій, виконання вишукувальних робіт, отримання технічних умов на підключення до мереж водопостачання, водовідведення, газопостачання, тепlopостачання та електропостачання і інших. Підготовлено та зареєстровано в Управлінні архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради 27 повідомлень про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з класом наслідків СС1, отримано два дозволи в Державній інспекції архітектурно-будівельного контролю в Полтавській області на об'єкти з класом наслідків СС2. На всі об'єкти оформлялися дозволи на проведення земляних робіт. Своєчасно надавалися відповіді та інформації на контрольні листи з Полтавської ОДА та інших установ та організацій. В системі електронного документообігу «Аскод» надавалися відповіді на звернення громадян та на депутатські звернення. В системі Прозоро висвітлювалася інформація щодо укладених договорів

вартістю більше 50,0 тис.грн., інформація щодо планування закупівель, оприлюднювалася інформація на Єдиному порталі використання публічних коштів, опрацьовувалася інформація щодо впровадження візуалізації міського бюджету за допомогою portalу «Відкритий бюджет» по всіх об'єктах відділу по яких передбачено фінансування в 2019 році. Працівниками готувалися проекти рішень сесій та виконавчого комітету. У відповідності до змін сесійних рішень щодо виділення додаткових бюджетних коштів або зменшення коштів по об'єктах відділу, вносилися відповідні зміни у бухгалтерський облік.

**В.о. начальника ВКБ**

**Н.І. Двигало**
